Aktualizovaný plán realizácie stavby

Stavba: II/534 Poprad - Smokovce, II. Etapa
Objekt:
Časť:
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Strabag s.r.o.

I. ETAPA
II. ETAPA
pokládka asfaltov
ZIMNÁ ÚDRŽBA - PRERUŠENIE VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRÁC

STRABAG

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2		4	5
		SO 02.2 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2 - 2.časť		
		ZTR 1 - Práca a vyrovnania z asfaltobetónu		
1	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	5,000
2	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva frakcie	m3	1 368,000
3	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stĺpov, oplotení z dielcov	m	932,500
8	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	m2	6 048,000
10	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	8 465,000
11	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	m2	8 465,000
12	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	5 333,200
16	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	9 480,000
17	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy	m2	119 448,000
18	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	40 079,000
19	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton,modif.VMT	m2	39 882,000
20	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón,modif.	m2	39 487,000
21	22040752	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	8 322,500
22	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 878,000
23	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	154,000
24	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia nárazníkové na zvodidlá	ks	43,000
25	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné značky	ks	26,000
26	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený	kus	6,000
27	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	40 079,000
28	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	40 256,250
29	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a nátierové	m2	2 423,380
		SO 02.3 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2 - 3.časť		
		ZTR 1 - Vysprávky na objektoch 02.2 a 05.2		
31	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	4,000
32	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva frakcie	m3	28,500
37	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	572,000
41	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	567,600
42	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy	m2	36 908,600
43	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	12 384,600
44	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton,modif.VMT	m2	12 202,000
45	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón,modif.	m2	12 202,000
46	22040752	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	2 182,500
47	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	75,000
48	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné značky	ks	30,000
49	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený	ks	6,000
50	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	12 384,600
51	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	13 175,100
52	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a nátierové	m2	885,380
		SO 03.0 - Úprava križovatky cest II/534 a III/3061		
		ZTR 1 - Práca a vyrovnania z asfaltobetónu		
53	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	31,000
54	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	25,000
55	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stĺpov, oplotení z dielcov	m	28,000
58	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	7,000
59	05060382	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 125,000
60	05060462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	190,000
63	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	40,000
64	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	m2	40,000
73	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	33,000
74	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	m2	6 439,000
75	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	2 187,000
76	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón,modif.VMT	m2	2 146,000
77	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón,modif.	m2	2 125,000
78	22040317	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových	m2	35,300
79	22040752	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	238,000
80	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	20,000
81	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený	ks	21,000
82	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	16,000
83	22250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m	102,000
84	22250861	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhrdové	m	47,000
85	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	28,000
86	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	2 187,000
87	22251491	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava	ks	5,000
88	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	2 125,000
89	22040417	Kryty dláždení,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	142,000
90	22250762	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	46,000
91	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a nátierové	m2	285,500
95	91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	4,000
96	84010210	Nátery kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	25,000
		SO 03.1 - Bezpečnostné osvetlenie priechodu pre chodcov		
97	01030102	Hĺbené výkopávky jám nezapažených	m3	4,000
98	01030201	Hĺbené výkopávky rýh š. do 600 mm	m3	8,000
105	91080101	Káble Cu - NN silové	m	110,000
110	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	2,000
111	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi	ks	6,000
112	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn	m	73,000
114	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - montáže - nástrešné uzemnenia	ks	2,000
115	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - montáže - bleskozvodu	ks	2,000
		SO 03.2 - Preložka diaľkového kábla ZSR		
118	01030102	Hĺbené výkopávky jám nezapažených	m3	8,000
120	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	13,000
123	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	m	64,000
124	01080503	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - založením trávnika hydroosevom	m2	16,000
125	92030101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - kábla diaľkové - uložené	m	70,000
130	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr plastových	m	64,000
		SO 05.2 - Rekonštrukcia dážďových priekop a kanalizácií , úsek č. 2 - 2.časť		
		ZTR 1 na objektoch 02.2 a 05.2		
		drenáž 3,388 – 3,768 km; 4,666 – 5,695 km - vpravo		
		drenáž 3,388 – 3,768 km – vľavo		
		kanalizácia - šachty		
		kanalizácia - monitoring		
		výustné objekty drenáže		
131	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	ks	36,000
132	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	17,000
133	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	380,920
134	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva frakcie	m3	835,050
135	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	2 938,000
136	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	2 930,000
137	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	2 278,270
139	05060462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	2 930,000
140	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	m2	1 113,400
141	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	832,120
142	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	m2	832,120
143	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	739,530
147	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	219,160
148	01060201	Premiestnenie vodorovné	m3	739,530
149	27031176	Kanalizácia, ostatné konštrukcie, dopinky	ks	53,000
150	27031170	Kanalizácia, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne	ks	12,000
151	27031177	Kanalizácia, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia,monitoring	m	522,000
152	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	1 938,290
153	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	m2	1 479,000
154	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	m2	2 930,000
155	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	1 479,850
156	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton,modif.VMT	m2	1 465,000
157	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón,modif.	m2	1 465,000
158	22040752	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	2 930,000
159	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	58,000
160	22250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m	2 938,000
161	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	3 030,000
162	22251491	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výškové úpravy	ks	43,000
163	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	958,080
164	11260028	Dokončovacie práce, čistenie objektov, kanálov, zásobníkov	m	522,000

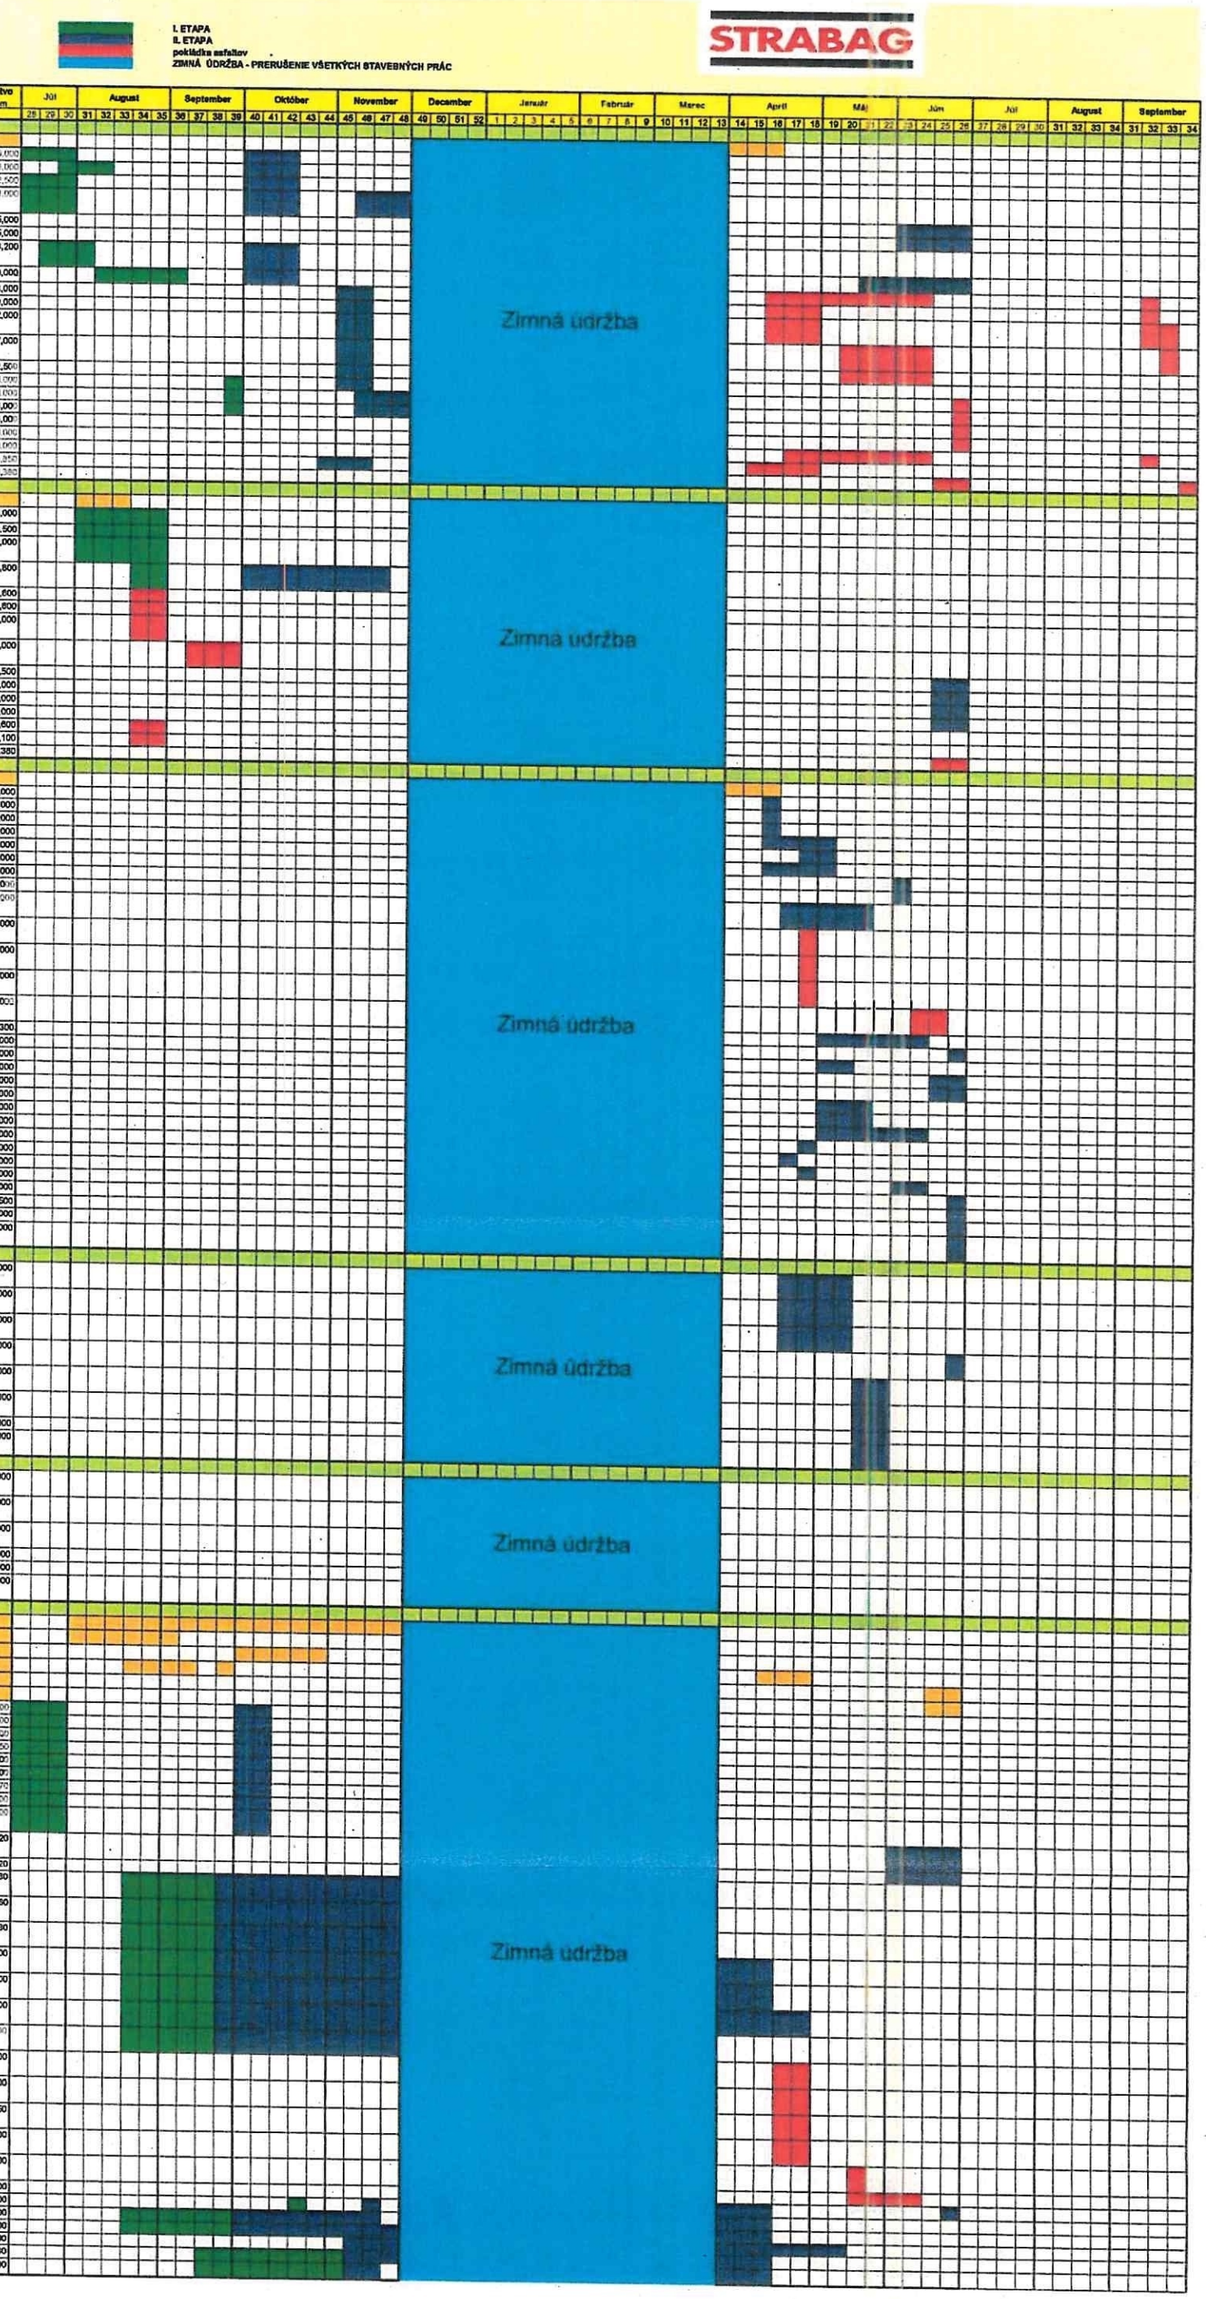

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
