ID	KOD POLOŽKY	Názov položky	merna jednotka	množstvo	Doba trvania
1	a	**Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa**			**540 dní**
2		**SO_001 - Všeobecné položky**			**540 dní**
3	00000120	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	5 dní
4	00000132	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	18,000	
5	00000133	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	25 dní
6	00000134	Dopravné značenie - dočasné (pomocné)	kpl	1,000	
7	00000135	Dočasná svetelná signalizácia	kpl	1,000	
8	00000136	Dokumentácia na vybranie plôc sklady (DVP)	kpl	1,000	
9	00000137	Dokumentácia skutočného realizovania skladby DSPRS	kpl	1,000	40 dní
10		**SO 01 Modernizácia cesty II/534, úsek č.1**			**50 dní**
11	**D2**	**DEMOLAČNÉ PRÁCE**			**14 dní**
12	00000182	Odstránenie spevnených plôch vozovok a zhutňujúcej kordónovej krytov bitúmenových	m2	408,000	8 dní
13	00000507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, ovládačov dopravného značenia, kovových	ks	29,000	2 dní
14	00060363	Doplňujúca práca, hĺbovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr. 60-80 mm	m2	8260,000	4 dní
15	00060462	Doplňujúca práca, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	1021,000	12 dní
16	00060200	Dopravа vybúraných hmôt vodorovná vrátane poplatkov za skládku	t	1887,600	8 dní
17	**D3**	**VÝKOPOVÉ PRÁCE A PRESUN ZEMIN**			**17 dní**
18	01020120	Odkopávky a prekopávky humózneho vrstvy, omrica	m3	140,000	5 dní
19	01060400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,Jakomic,piliín	m3	1600,000	12 dní
20	01040120	Kordónovica v hornín - skládky	m3	1473,000	12 dní
21	01040202	Kordónovica v hornín - nákupy na zhutnenim	m3	133,000	3 dní
22	01060204	Premiestnenie vodorovné vrátane poplatkov za uskladnenie	m3	1663,000	12 dní
23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	133,000	1 deň
24	**D4**	**PRIESKUMNÉ VRYTY A VRTNÉ PRÁCE**			**3 dní**
25	02020175	Vrty pre kotvenie, injekcii, inklinajtely a monitoring na povrchu, in horniny V	ks	20,000	3 dní
26	**D5**	**PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**21 dní**
27	20010120	Podkladné a krycie vrstvy bez spojov. nastriekanej, kamenno drvené	m2	582,000	5 dní
28	20010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojov, spevnené krajmi, štrkotrieba	m2	50,000	4 dní
29	20050528	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pozdĺžne, nátery,pasyvy infiltrácií pozdĺž	m2	510,000	1 deň
30	**D6**	**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**31 dní**
31	20050030	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pozdĺžne, nátery,pasyvy spojovací pozdĺž	m2	26735,380	6 dní
32	20050427	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, ernušné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	9779,150	2 dní
33	20050445	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	19904,200	8 dní
34	20100001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí cpravа škár , asfaltová zálievka	m	365,000	3 dní
35	20050444	Doplňujúca kordónovica, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	74,000	2 dní
36	20050467	Doplňujúca kordónovica, ochranné zariadenia, nosič z pasívnou bezpečnostnou	ks	1,000	2 dní
37	20050671	Doplňujúca kordónovica, zvislé dopravné značky, rozmiešky rozmer alebo zvláštnych rozmer	ks	6,000	3 dní
38	20050672	Doplňujúca kordónovica, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	1,000	2 dní
39	20051445	Doplňujúca kordónovica, pri úseku kryšu komunikácií, cestičná vložka	m2	9779,150	4 dní
40	**D7**	**STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK**			**2 dní**
41	20350776	Doplňujúca kordónovica, vodorovné dopravné značenie striekané a reliérové	m2	573,000	2 dní
42	**D8**	**ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ**			**15 dní**
43	30010039	Zapúšťanie základovej plošty, trakovitý kompaktné z pohrúdka plastobetónu	m	1019,000	10 dní
44	30010303	Zapúšťanie základovej plošty, ohranične vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	4284,000	4 dní
45	30010603	Zapúšťanie základovej plošty, vyrovná vrstvy z hornina drveného	m3	1173,000	5 dní
46		**SO 02.1 Modernizácia cesty II/534, úsek č.2 – 1.časť**			**129 dní**
47	**D1**	**DEMOLAČNÉ PRÁCE**			**28 dní**
48	00020320	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z hornina ľahkého	m3	1700,000	8 dní
49	00020507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, ovládačov dopravného značenia, kovových	ks	130,000	3 dní
50	00020608	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, Ibárov	m	146,000	2 dní
51	00020401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,ohen, spätident z dlaždov-prefabrikovaných	m	192,000	2 dní
52	00060200	Dopravа vybúraných hmôt vodorovná vrátane poplatkov za skládku	t	11008,800	8 dní
53	00060362	Doplňujúca práca, hĺbovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	28690,000	8 dní
54	00060462	Doplňujúca práca, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	3850,000	20 dní
55	**D2**	**PRÍPRAVA STAVENISKA A VÝČISTOVACIE PRÁCE**			**8 dní**
56	01030120	Frézovanie plôch, odstránenie poruchov trávnín	m2	8469,900	8 dní
57	**D3**	**REKULTIVAČNÉ PRÁCE**			**56 dní**
58	01080520	Povrchové úpravy terénu, úpravy plochého rozprestretím ornice	m2	9465,000	16 dní
59	01080523	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov zásobárním kávinka hydrosiavovom	m2	9465,000	4 dní
60	**D4**	**OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE**			**42 dní**
61	01020120	Odkopávky a prekopávky humózneho vrstvy, omrica	m3	2372,200	10 dní
62	01060400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,Jakomic,piliín	m3	8623,480	20 dní
63	01040202	Kordónovica v hornín - nákupy na zhutnenim	m3	1447,230	5 dní
64	01040120	Kordónovica v hornín - skládky	m3	10998,880	20 dní
65	01060204	Premiestnenie vodorovné vrátane poplatkov za uskladnenie	m3	10998,880	20 dní
66	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1447,230	5 dní
67	01080400	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	20598,000	12 dní
68	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	9109,000	5 dní
69	**D5**	**PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**69 dní**
70	20010120	Podkladné a krycie vrstvy bez spojov. nastriekanej, kamenno drvené	m2	4629,000	7 dní
71	20010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojov, spevnené krajmi, štrkotrieba	m2	688,800	8 dní
72	20050529	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pozdĺžne, nátery,pasyvy infiltrácií pozdĺž	m2	2760,300	1 deň
73	27051175	Kanalizácie, vsádzkové kordónovica, betónu a spätnovoľná kanalizácií	ks	16,000	5 dní
74	**D6**	**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**91 dní**
75	20050030	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pozdĺžne, nátery,pasyvy spojovací pozdĺž	m2	132140,200	35 dní
76	20050427	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, ernušné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	39241,300	10 dní
77	20050445	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	90747,300	25 dní
78	20540752	Vrsty obdĺžnikovú chodníkovú komunikácií,rigolov - vyplnenie štrká ekaštickou zálievkou	m	5345,500	8 dní
79	20050362	Doplňujúca kordónovica, zvodidlá ocelové	m	348,000	10 dní
80	20050464	Doplňujúca kordónovica, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	132,000	4 dní
81	20050465	Doplňujúca kordónovica, ochranné zariadenia, nárazovníc na zvodidlá	ks	36,000	1 deň
82	20050467	Doplňujúca kordónovica, ochranné zariadenia, nosič z pasívnou bezpečnostnou	ks	1,000	4 dní
83	20050671	Doplňujúca kordónovica, zvislé dopravné značky, rozmiešky rozmer alebo zvláštnych rozmer	ks	26,000	8 dní
84	20050672	Doplňujúca kordónovica, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	1,000	2 dní
85	20051181	Doplňujúca kordónovica, stoviení žĺtaby z betónových kocníc	m	146,000	3 dní
86	20051445	Doplňujúca kordónovica, pri úseku kryšu komunikácií, cestičná vložka	m2	90241,800	15 dní
87	20351582	Doplňujúca kordónovica, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	25093,500	15 dní
88	**D7**	**NATIERACIE PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH**			**8 dní**
89	20350776	Doplňujúca kordónovica, vodorovné dopravné značenie striekané a reliérové	m2	1593,630	8 dní
90	**D8**	**ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ**			**25 dní**
91	30010039	Zapúšťanie základovej plošty, trakovitý kompaktné z pohrúdka plastobetónu	m	2639,000	15 dní
92	30010303	Zapúšťanie základovej plošty, ohranične vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	27700,800	7 dní
93	30010603	Zapúšťanie základovej plošty, vyrovná vrstvy z hornina drveného	m3	3684,520	10 dní
94		**SO 04 Rekonštrukcia dážďových prielepov a kanalizácií, úsek č.1**			**24 dní**
95	**D1**	**DEMOLAČNÉ PRÁCE**			**8 dní**
96	00020512	Vyžíznutie kordónovú a demontáže, rôznych predmetov betónových-výkopne rigole	m	1019,000	6 dní
97	00020607	Vyžíznutie kordónovú a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	20,000	2 dní
98	00020604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	1023,000	6 dní
99	00060200	Dopravа vybúraných hmôt vodorovná vrátane poplatkov za skládku	t	582,100	6 dní
100	**D2**	**VŠEOBECNÉ PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ**			**3 dní**
101	27050218	Kanalizácie, ostatné kordónovica, dopínky	ks	20,000	3 dní
102	**D3**	**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**18 dní**
103	20050001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí cpravа škár , asfaltová zálievka	m	2044,000	3 dní
104	20540017	Vrsty obdĺžnikovú chodníkovú komunikácií,rigolov z dlaždic betónových	m	1021,000	12 dní
105	20050680	Doplňujúca kordónovica, obrubníky chodníkové	m	1023,000	8 dní
106	20051450	Doplňujúca kordónovica, pri úseku kryšu komunikácií, cestičná úprava	ks	80,000	4 dní
107	**D4**	**KLADENIE KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ**			**3 dní**
108	88010380	Kanalizácia, zaťažovania a monitoring	m	595,000	2 dní
109	88010390	Kanalizácia, zaťažovania a monitoring kanalizačnejprípojok z vapolstov	m	130,000	1 deň
110		**SO 05.1 Rekonštrukcia dážďových prielepov a kanalizácií, úsek č.2 – 1.časť**			**36 dní**
111	**D1**	**DEMOLAČNÉ PRÁCE**			**10 dní**
112	00020512	Vyžíznutie kordónovú a demontáže, rôznych predmetov betónových-výkopne rigole	m	2075,000	10 dní
113	00020607	Vyžíznutie kordónovú a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	18,000	2 dní
114	00020604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	2080,000	10 dní
115	00060200	Dopravа vybúraných hmôt vodorovná vrátane poplatkov za skládku	t	1184,100	10 dní
116	**D2**	**VŠEOBECNÉ PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ**			**2 dní**
117	27050218	Kanalizácie, ostatné kordónovica, dopínky	ks	18,000	2 dní
118	**D3**	**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**27 dní**
119	20050001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí cpravа škár , asfaltová zálievka	m	4150,000	6 dní
120	20540017	Vrsty obdĺžnikovú chodníkovú komunikácií,rigolov z dlaždic betónových	m	2075,000	20 dní
121	20050680	Doplňujúca kordónovica, obrubníky chodníkové	m	2100,000	12 dní
122	20051450	Doplňujúca kordónovica, pri úseku kryšu komunikácií, cestičná úprava	ks	84,000	3 dní
123	**D4**	**KLADENIE KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ**			**5 dní**
124	88010380	Kanalizácia, zaťažovania a monitoring	m	417,000	3 dní
125	88010390	Kanalizácia, zaťažovania a monitoring kanalizačnejprípojok z vapolstov	m	120,000	2 dní
126		**SO06 Rekonštrukcia mosta č. 004 v km 0,700 cesty II/534 nad Veľkým potokom**			**46 dní**
127	**D1**	**DEMOLAČNÉ PRÁCE**			**10 dní**
128	00010120	Búranie kordónovú betónov, železobetónových	m3	83,480	8 dní
129	00020120	Vyžíznutie, odstránenie kordónovú - izolácie penetráciou	m2	267,600	4 dní
130	00020620	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	148,200	4 dní
131	00020262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov betónovových	m2	380,460	2 dní
132	00020607	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,ohen, spätident kovových	m	145,000	2 dní
133	00060200	Dopravа vybúraných hmôt vrát. nákladov za zhodnocovania vybúraných hmôt	t	286,870	8 dní
134	**D2**	**PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNIC**			**36 dní**
135	11000002	Zvislá kordónovica mŕtvorezných stavieb, rímsy z betónu železobetónu	m3	34,980	4 dní
136	11000011	Zvislá kordónovica mŕtvorezných stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	75,270	6 dní
137	11000021	Zvislá kordónovica mŕtvorezných stavieb, rímsy, výstuž z betónárskej ocele	t	5,420	6 dní
138	11060202	Vodorovné nosné kordónovica mŕtvorezných stavieb, mostné dosky, Mantly z betónu Železobetónu	m3	46,650	4 dní
139	11060211	Vodorovné nosné kordónovica mŕtvorezných stavieb, mostné dosky, Mantly, debnenie tradičné	m2	11,640	2 dní
140	11060221	Vodorovné nosné kordónovica mŕtvorezných stavieb, mostné dosky, Mantly, výstuž z betónárskej ocele	t	8,950	8 dní
141	21250136	Doplňujúca kordónovica, zvodidlá ocelové	m	146,000	4 dní
142	21350436	Doplňujúca kordónovica, zábradlia ocelové	m	50,000	4 dní
143	21350425	Doplňujúca kordónovica dočasná ranaberia mostné závery podpovrchové	m	30,070	4 dní
144	**D3**	**IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE**			**4 dní**
145	31310532	Izolácia proti vode a samoraj ohřevať, modifikovaná papier	m2	320,380	4 dní
146	**D4**	**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**6 dní**
147	20050030	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pozdĺžne, nátery,pasyvy spojovací pozdĺž	m2	868,580	2 dní
148	20050640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	445,720	2 dní
149	20050643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m	19,150	1 deň
150	20540752	Vrsty obdĺžnikovú chodníkovú komunikácií,rigolov - vyplnenie štrká ekaštickou zálievkou	m	91,000	2 dní
151	20350671	Doplňujúca kordónovica, zvislé dopravné značky, rozmiešky rozmer alebo zvláštnych rozmer	ks	4,000	1 deň
152	20350680	Doplňujúca kordónovica, obrubníky chodníkové	m	8,000	1 deň
153	20350690	Doplňujúca kordónovica, obrubníky zámerové	m	10,000	1 deň
154	**D5**	**PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE OPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV**			**1 deň**
155	31210303	Spevnené plochy, dlažby z betonárke kamaňa	m2	8,100	1 deň
156	**D6**	**ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE**			**8 dní**
157	35000176	Vrty pre kotvenie, injekcii, inklinajtely a monitoring na povrchu, in horniny VI,	m	137,400	8 dní
158	**D7**	**OSTATNÉ BETÓNÁRSKE PRÁCE**			**1 deň**
159	11000120	Podkladné kordónovica, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	8,100	1 deň
160	**D8**	**OMIETKARSKE PRÁCE**			**4 dní**
161	13070113	Vonkajšia povrchy podhľadov, reprofilácia podhľadov malbou sanačnou	m2	187,800	3 dní
162	13091113	Vonkajšia povrchy stien, reprofilácia zvislých a klenutých plôch malbou sanačnou	m2	17,710	1 deň
163	**D9**	**MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB**			**2 dní**
164	94010816	Nátor omietok z betónových povrchov, impregnačný cementový nátor	m2	394,350	2 dní
165		**SO 07 Rekonštrukcia mosta č. 006 v km 1,850 cesty II/534 nad Červeným potokom**			**35 dní**
166	**D1**	**DEMOLAČNÉ PRÁCE**			**8 dní**
167	00010120	Búranie kordónovú betónov, železobetónových	m3	36,550	6 dní
168	00020120	Vyžíznutie, odstránenie kordónovú - izolácie penetráciou	m2	216,700	4 dní
169	00020620	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	216,700	4 dní
170	00020262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov betónovových	m2	433,400	2 dní
171	00020407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,ohen, spätident kovových	m	45,000	2 dní
172	00060200	Dopravа vybúraných hmôt vrát. nákladov za zhodnocovania vybúraných hmôt	t	221,120	6 dní
173	**D2**	**PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNIC**			**27 dní**
174	11000002	Zvislá kordónovica mŕtvorezných stavieb, rímsy z betónu železobetónu	m3	8,460	2 dní
175	11000011	Zvislá kordónovica mŕtvorezných stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	36,250	4 dní
176	11000021	Zvislá kordónovica mŕtvorezných stavieb, rímsy, výstuž z betónárskej ocele	t	2,450	4 dní
177	11060202	Vodorovné nosné kordónovica mŕtvorezných stavieb, mostné dosky, Mantly z betónu Železobetónu	m3	31,450	2 dní
178	11060211	Vodorovné nosné kordónovica mŕtvorezných stavieb, mostné dosky, Mantly, debnenie tradičné	m2	20,270	2 dní
179	11060221	Vodorovné nosné kordónovica mŕtvorezných stavieb, mostné dosky, Mantly, výstuž z betónárskej ocele	t	4,600	6 dní
180	21250136	Doplňujúca kordónovica, zvodidlá ocelové	m	44,000	2 dní
181	21350425	Doplňujúca kordónovica dočasná ranaberia mostné závery podpovrchové	m	35,840	6 dní
182	**D3**	**IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE**			**4 dní**
183	31310532	Izolácia proti vode a samoraj ohřevať, modifikovaná papier	m2	258,400	4 dní
184	**D4**	**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍS**			**13 dní**
185	20050030	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pozdĺžne, nátery,pasyvy spojovací pozdĺž	m2	850,100	2 dní
186	20050640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	433,400	2 dní
187	20050643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m	14,270	2 dní
188	20540752	Vrsty obdĺžnikovú chodníkovú komunikácií,rigolov - vyplnenie štrká ekaštickou zálievkou	m	45,000	2 dní
189	20350671	Doplňujúca kordónovica, zvislé dopravné značky, rozmiešky rozmer alebo zvláštnych rozmer	ks	4,000	2 dní
190	20350680	Doplňujúca kordónovica, obrubníky chodníkové	m	8,000	1 deň
191	20350690	Doplňujúca kordónovica, obrubníky zámerové	m	8,400	1 deň
192	**D5**	**PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE OPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV**			**1 deň**
193	31210303	Spevnené plochy, dlažby z betonárke kamaňa	m2	8,400	1 deň
194	**D6**	**ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE**			**8 dní**
195	35000176	Vrty pre kotvenie, injekcii, inklinajtely a monitoring na povrchu, in horniny VI,	m	93,940	8 dní
196	**D7**	**OSTATNÉ BETÓNÁRSKE PRÁCE**			**1 deň**
197	11000120	Podkladné kordónovica, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	8,400	1 deň
198	**D8**	**OMIETKARSKE PRÁCE**			**3 dní**
199	13070113	Vonkajšia povrchy podhľadov, reprofilácia podhľadov malbou sanačnou	m2	124,800	2 dní
200	13091113	Vonkajšia povrchy stien, reprofilácia zvislých a klenutých plôch malbou sanačnou	m2	11,230	1 deň
201	**D9**	**MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB**			**1 deň**
202	94010816	Nátor omietok z betónových povrchov, impregnačný cementový nátor	m2	191,290	1 deň
203		**KLIMATICKÉ PODMIENKY - ZIMNÁ ÚDRŽBA OD 31.10 - 31.3**			**150 dní**
204		ZIMNÉ OBDOBIE	KPL	150	150 dní

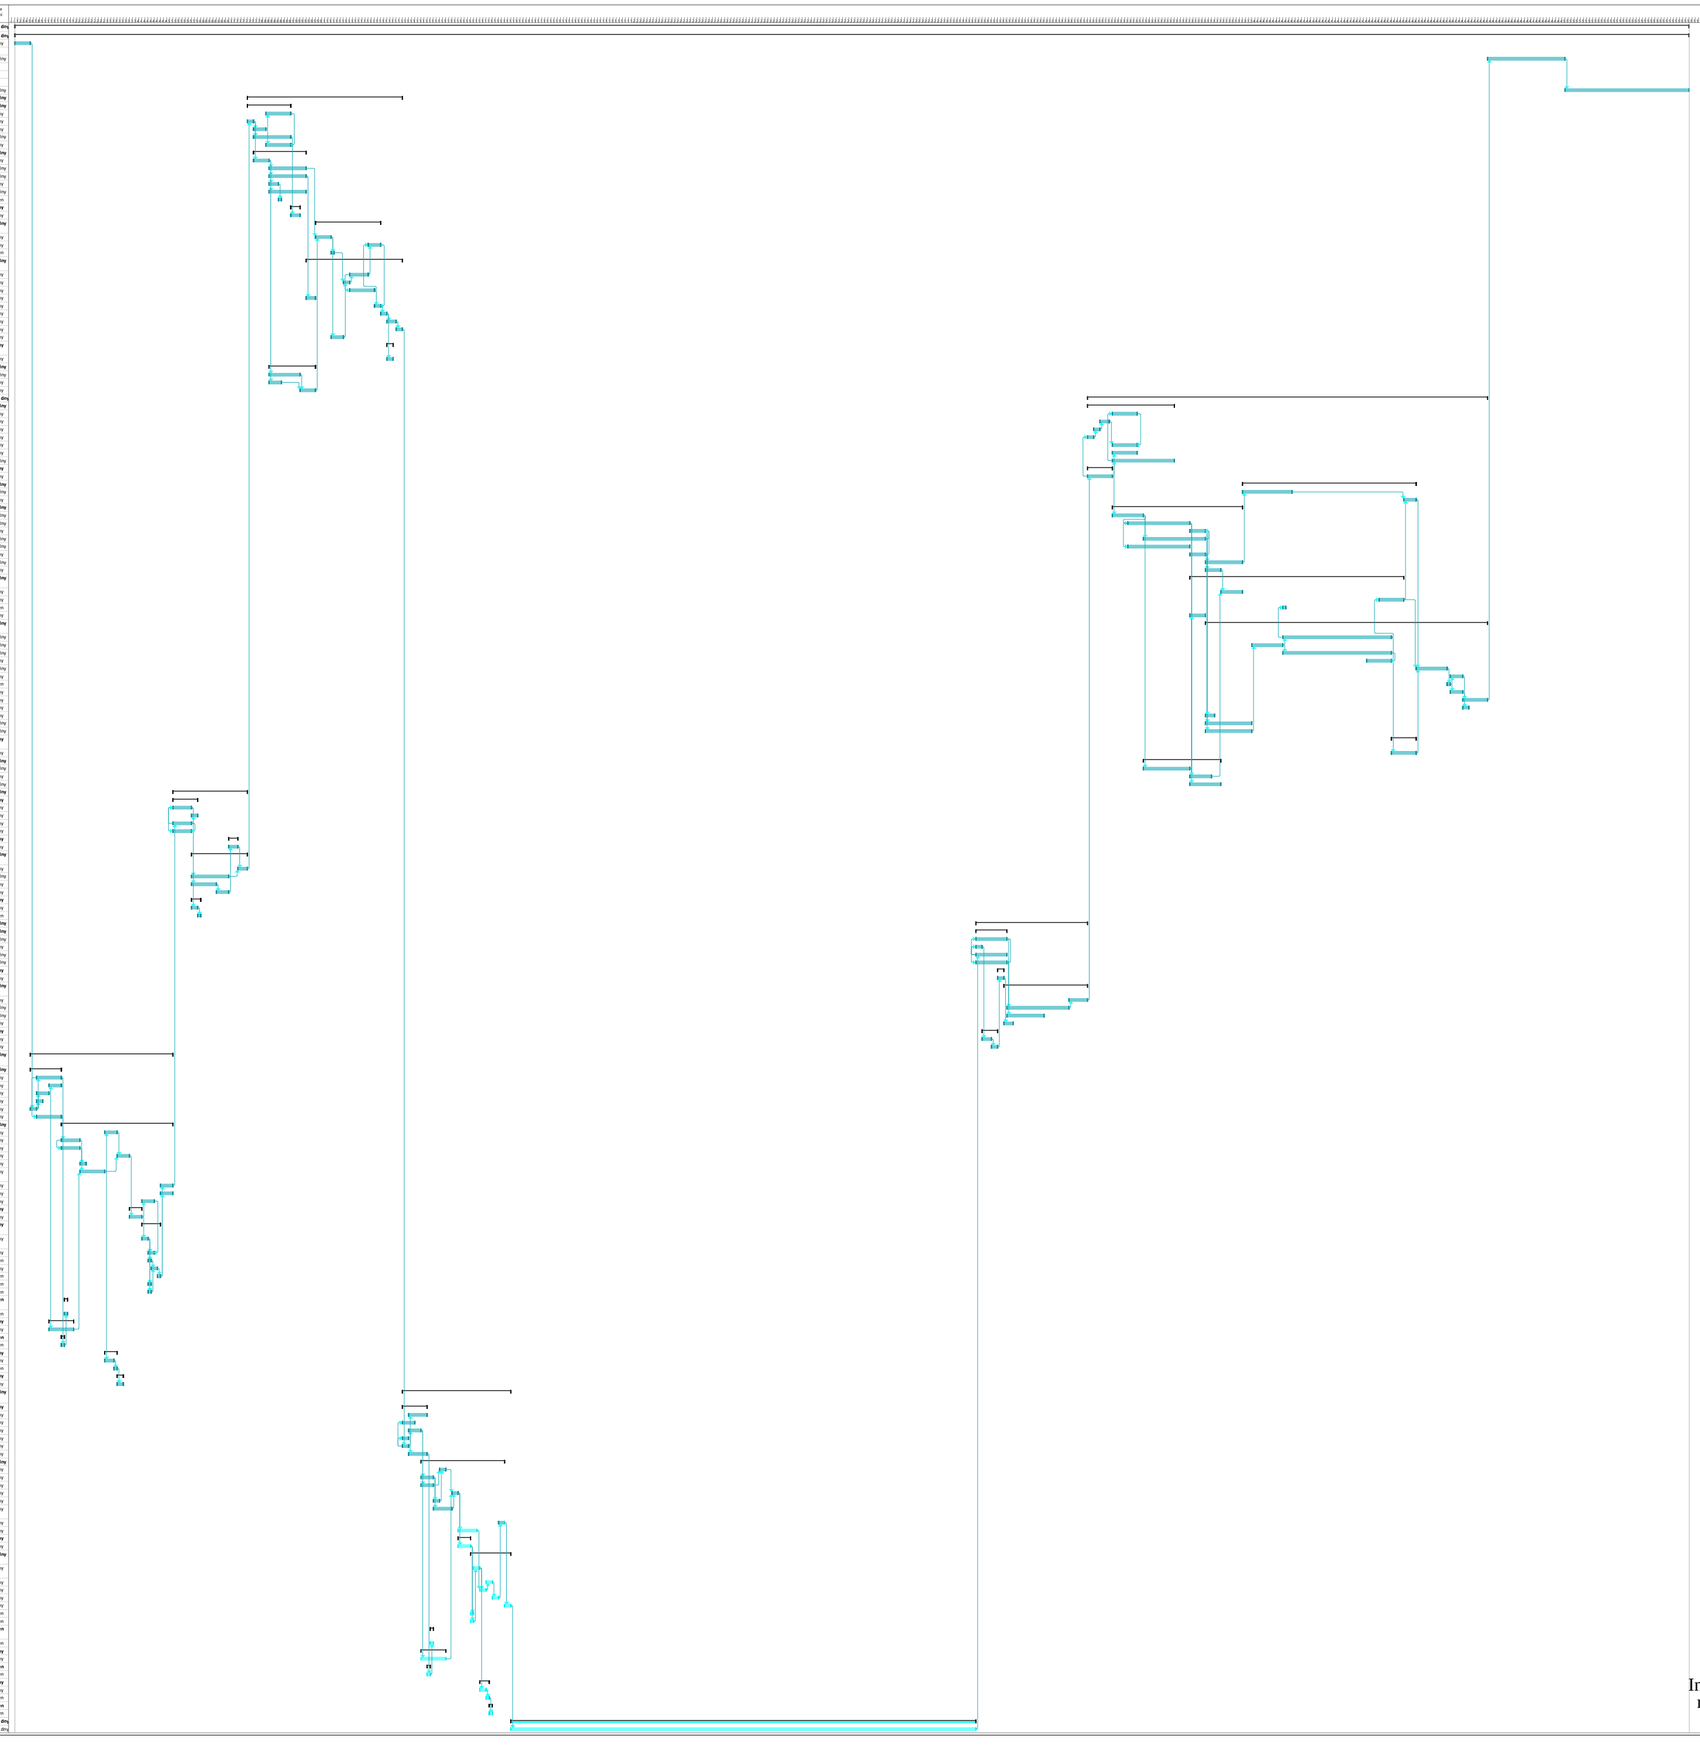

v.r.
Ing. Marcel Horváth
riaditeľ SÚC PSK

v.r.
Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
EUROVIA SK, a.s.

v.r.
Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ
EUROVIA SK, a.s.
