AKTUALIZOVANÝ PLÁN REALIZÁCIE VÝSTAVBY

Stavba: II/546 Prešov . Klenov

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o.
Vypracoval : Ing. Ronald Pechs
Dátum : 4.12.2019

Č. objektu/dielu	Názov objektu/dielu	Rozpočet
01	**Rekonštrukcia cesty II/546**	
SO 01	**Modernizácia cesty**	
SO 01.1	**Úsek č.1**	**536 395,65**
	DEMOLAČNÉ PRÁCE	
1	Búranie betonového rigolu 174m, krajníkov 317m	
2	Výmeny (952m2) - odstránenie krytu asfaltového hr.100mm	
3	Výmeny (952m2) - odstránenie štrkodrviny	
4	Odstránenie bitumenového krytu - frezovanie (19592m2)	
5	Odstránenie zvodidiel, zábradlí...	
	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE	
6	Odkopávka komunikácie - priekopa 231m3, podložie 294m3	
	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE	
7	Podkladná vrstva zo ŠD hr. 220mm (952m2)	
8	Podkladná vrstva CBGM hr. 150mm(952m2)	
9	Spevnenie krajníc štrkodrvinou hr. 150mm (364m3)	
	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE	
10	Podkladné a krycie vrstvy - spojovací postrek 2x (41088m2)	
11	Podkladné a krycie vrstvy - výmeny (952m2) - AC16 hr. 80mm + AC11 hr. 50mm	
12	Podkladné a krycie vrstvy - (19952m2) - AC16 hr. 50mm + AC11 hr. 50mm	
	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	
13	Zlešenie základovej pôdy - geotextília + ŠD 0-125mm hr. 300mm (952m2)	
	DOPLŇUJÚCE PRÁCE	
14	Osadenie - zvodidlá 868m, smerové stĺpiky, VDZ...	
15	Osadenie - obrudníky 212m,vegetačné tvárnice, žľabovky 1435m	
16	Osadenie - osadenie výstužnej vložky (19800m2)	
SO 01.2	**Úsek č.2**	***354 599,34***
	DEMOLAČNÉ PRÁCE	
17	Výmeny (2096m2) - odstránenie krytu asfaltového hr.100mm	
18	Výmeny (2096m2) - odstránenie štrkodrviny	
19	Odstránenie bitumenového krytu - frezovanie (8375m2)	
	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE	
20	Odkopávka komunikácie - podložie 979m3	
	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE	
21	Podkladná vrstva CBGM hr. 150mm(2096m2)	
22	Spevnenie krajníc štrkodrvinou hr. 150mm (315m3)	
	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE	
23	Podkladné a krycie vrstvy - spojovací postrek (20942m2)	
24	Podkladné a krycie vrstvy - výmeny (2096m2) - AC16 hr. 80mm + AC11 hr. 50mm	
25	Podkladné a krycie vrstvy - AC16 hr. 50mm + AC11 hr. 50mm (20920m2)	
	DOPLŇUJÚCE PRÁCE	
26	Osadenie - smerové stĺpiky, ZDZ, VDZ...	
27	Osadenie - dláždená priekopa 2004m	
28	Osadenie - osadenie výstužnej vložky (8794m2)	
	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	
29	Zlešenie základovej pôdy - geotextília + ŠD 0-125mm hr. 300mm (2096m2)	
SO 01.3	**Úsek č.3**	**488 671,79**
	DEMOLAČNÉ PRÁCE	
30	Búranie betonových, krajníkov 194m	

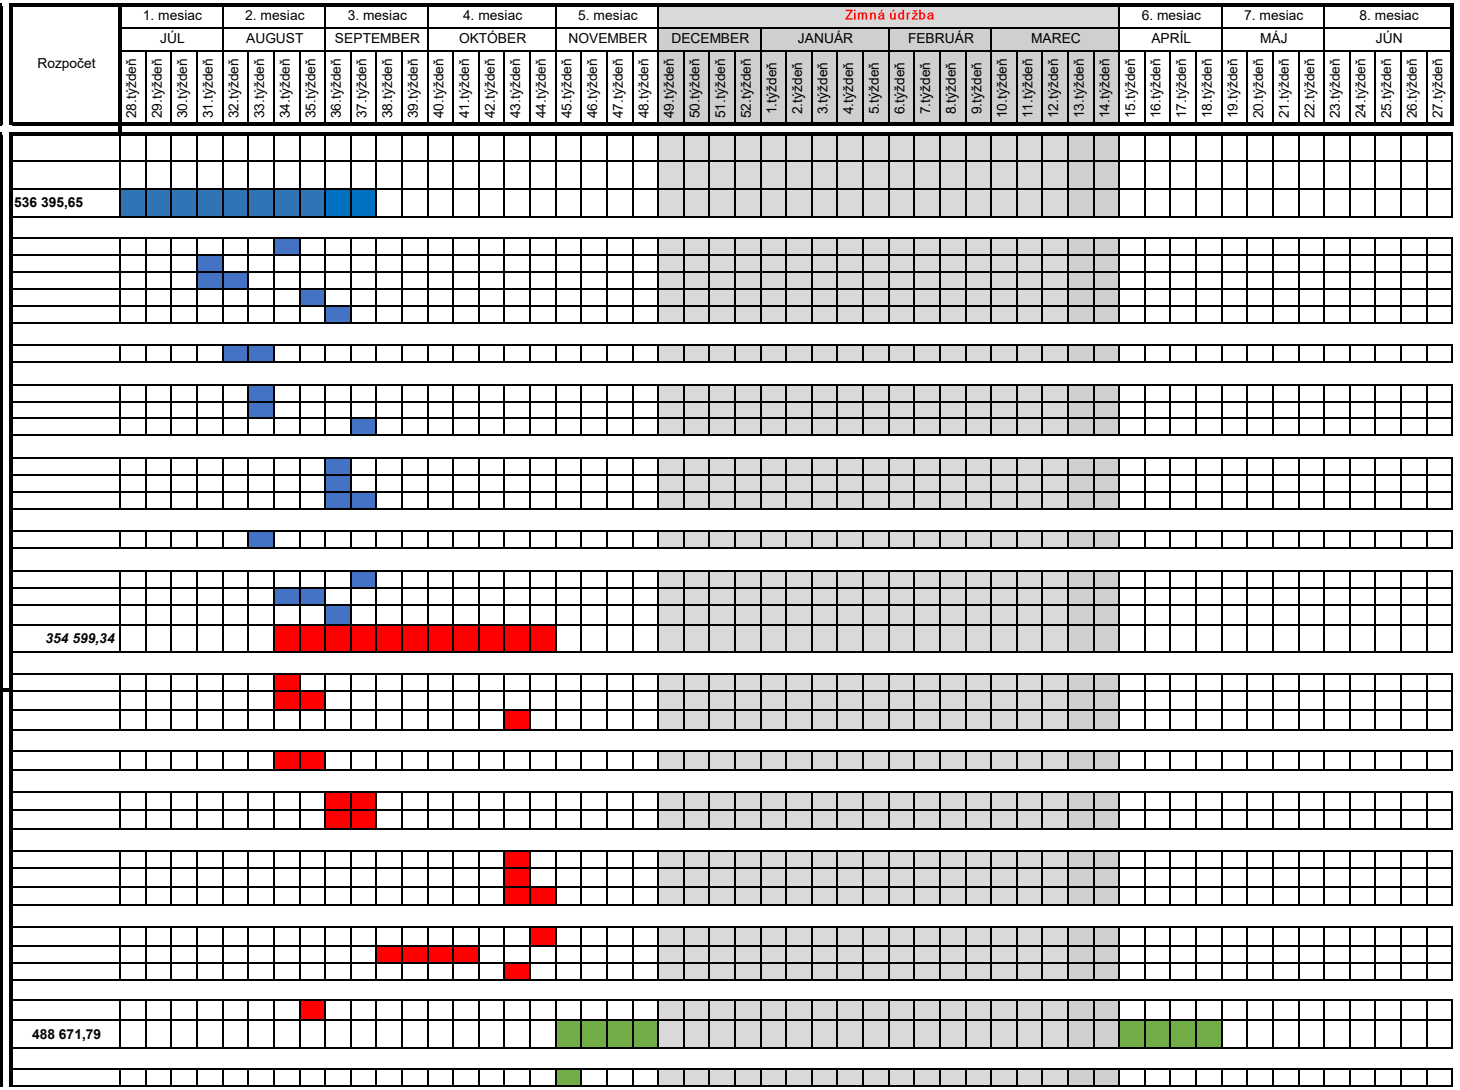

Č. objektu/dielu	Názov objektu/dielu	Rozpočet	28.týždeň	29.týždeň	30.týždeň	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň	36.týždeň	37.týždeň	38.týždeň	39.týždeň	40.týždeň	41.týždeň	42.týždeň	43.týždeň	44.týždeň	45.týždeň	46.týždeň	47.týždeň	48.týždeň	49.týždeň	50.týždeň	51.týždeň	52.týždeň	1.týždeň	2.týždeň	3.týždeň	4.týždeň	5.týždeň	6.týždeň	7.týždeň	8.týždeň	9.týždeň	10.týždeň	11.týždeň	12.týždeň	13.týždeň	14.týždeň	15.týždeň	16.týždeň	17.týždeň	18.týždeň	19.týždeň	20.týždeň	21.týždeň	22.týždeň	23.týždeň	24.týždeň	25.týždeň	26.týždeň	27.týždeň
31	Výmeny (60m2) - odstránenie krytu asfaltového hr.100mm																																																				
32	Výmeny (60m2) - odstránenie štrkodrviny																																																				
33	Odstránenie bitumenového krytu - frezovanie (10170m2)																																																				
34	Odstránenie zvodidiel, zábradlí...																																																				
	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE																																																				
35	Odkopávka komunikácie - priekopy 389m3																																																				
	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE																																																				
36	Podkladná vrstva zo ŠD hr. 220mm (60m2)																																																				
37	Podkladná vrstva CBGM hr. 150mm (60m2)																																																				
38	Spevnenie krajníc štrkodrvinou hr. 150mm (270m3)																																																				
	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE																																																				
39	Podkladné a krycie vrstvy - spojovací postrek 2x (20460m2)																																																				
40	Podkladné a krycie vrstvy - AC16 hr. 50mm + AC11 hr. 50mm (20460m2)																																																				
	DOPLŇUJÚCE PRÁCE																																																				
41	Osadenie - zvodidlá 2028m, smerové stĺpiky, ZDZ, VDZ...																																																				
42	Osadenie - dláždená priekopa 417m + čistenie priepustov pozdĺžne s cestou 122m																																																				
43	Osadenie - bet. obrubníky 2726m																																																				
44	Osadenie - osadenie výstužnej vložky (36800m2)																																																				
SO 01.4	**Úsek č.4**	**371 314,78**																																																			
	DEMOLAČNÉ PRÁCE																																																				
45	Odstránenie bitumenového krytu - frezovanie (12650m2)																																																				
	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE																																																				
46	Odkopávka komunikácie - priekopy 363m3																																																				
	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE																																																				
47	Podkladná vrstva zo ŠD hr. 220mm (1890m2)																																																				
48	Podkladná vrstva CBGM hr. 150mm (1890m2)																																																				
49	Spevnenie krajníc štrkodrvinou hr. 150mm (220m3)																																																				
	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE																																																				
50	Podkladné a krycie vrstvy - spojovací postrek 2x (25300m2)																																																				
51	Podkladné a krycie vrstvy - AC16 hr. 50mm + AC11 hr. 50mm (25300m2)																																																				
	DOPLŇUJÚCE PRÁCE																																																				
52	Osadenie - zvodidlá 56m, smerové stĺpiky, ZDZ, VDZ...																																																				
53	Osadenie - dláždená priekopa 2590m + čistenie priepustov pozdĺžne s cestou 68m																																																				
54	Osadenie - osadenie výstužnej vložky (13283m2)																																																				
SO 01.5	**Úsek č.5**	**465 401,97**																																																			
	DEMOLAČNÉ PRÁCE																																																				
55	Výmeny (1790m2) - odstránenie krytu asfaltového hr.100mm																																																				
56	Výmeny (1790m2) - odstránenie štrkodrviny																																																				
57	Odstránenie bitumenového krytu - frezovanie (13250m2)																																																				
	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE																																																				
58	Odkopávka komunikácie - priekopy 910m3																																																				
	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE																																																				
59	Podkladná vrstva zo ŠD hr. 220mm (1790m2)																																																				
60	Podkladná vrstva CBGM hr. 150mm (1790m2)																																																				
61	Spevnenie krajníc štrkodrvinou hr. 150mm (284m3)																																																				
	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE KOMUNIKÁCIE																																																				
62	Podkladné a krycie vrstvy - spojovací postrek 2x (75728m2)																																																				
63	Podkladné a krycie vrstvy - AC16 hr. 50mm + AC11 hr. 50mm (30080m2)																																																				
	DOPLŇUJÚCE PRÁCE																																																				
64	Osadenie - zvodidlá 390m, smerové stĺpiky, ZDZ, VDZ...																																																				
65	Osadenie - dláždená priekopa 2666m + čistenie priepustov pozdĺžne s cestou 54m																																																				
66	Osadenie - osadenie výstužnej vložky (13913m2)																																																				
	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE																																																				
67	Zlešenie základovej pôdy - geotextília + ŠD 0-125mm hr. 300mm (1790m2)																																																				
SO 02	**Rekonštrukcia mostných objektov 546-005 a 546-006**																																																				
SO 02.1	**Rekonštrukcia mostného objektu 546-005**	**130 313,83**																																																			
	DEMOLAČNÉ PRÁCE																																																				
68	Odstránenie spevnených plôch - bitumén, štrkodrva, izolácie, základy, zábradlia...																																																				
	VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE																																																				
	Hlbenie rýh - zaistovací prah																																																				

Č. objektu/dielu	Názov objektu/dielu	Rozpočet	28.týždeň	29.týždeň	30.týždeň	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň	36.týždeň	37.týždeň	38.týždeň	39.týždeň	40.týždeň	41.týždeň	42.týždeň	43.týždeň	44.týždeň	45.týždeň	46.týždeň	47.týždeň	48.týždeň	49.týždeň	50.týždeň	51.týždeň	52.týždeň	1.týždeň	2.týždeň	3.týždeň	4.týždeň	5.týždeň	6.týždeň	7.týždeň	8.týždeň	9.týždeň	10.týždeň	11.týždeň	12.týždeň	13.týždeň	14.týždeň	15.týždeň	16.týždeň	17.týždeň	18.týždeň	19.týždeň	20.týždeň	21.týždeň	22.týždeň	23.týždeň	24.týždeň	25.týždeň	26.týždeň	27.týždeň
	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV																																																				
69	Rimsy - debnenie, kotvenie, výstuž, betonáž...																																																				
70	Betonáž - zaisťovacie prahy, spevn. plochy z lomového kameňa, beton. tvárnic																																																				
71	Spriahujúca doska - výstuž, debnenie, betonáž, izolácie...																																																				
72	Doplňujúce konštrukcie - obrubníky, zvodidlá, zábradlia, ZDZ ...																																																				
	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE MOSTOV																																																				
73	Podkladné krycie vrstvy - spojovací postrek																																																				
74	Podkladné krycie vrstvy - AC1 PMB 40mm + AC 1 PMB 45mm + drenážny kanálik, zálievky																																																				
	OMIETKÁRSKE PRÁCE A NÁTERY																																																				
75	Reprofilácia pohľadov, nátery betón. povrchov																																																				
SO 02.2	**Rekonštrukcia mostného objektu 546-006**	**25 271,11**																																																			
	DEMOLAČNÉ PRÁCE																																																				
76	Odstránenie - rimsa, zábradlie..																																																				
	VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE																																																				
77	Prevedenie vody, odstránenie nánosu z most. otvoru a koryta																																																				
	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV																																																				
78	Rimsy - debnenie, kotvenie, výstuž, betonáž...																																																				
79	Kalová jama - výkop, debnenie, betonáž...																																																				
80	Doplňujúce konštrukcie - zvodidlá, zábradlia, ZDZ ...																																																				
81	Spevnené plochy - dlažba z lom. kameňa, zaisťovací prah																																																				
	PRÁCE NA SPODEJ STAVBE																																																				
82	Podklad - štrkodrvina, CBGM																																																				
	OMIETKÁRSKE PRÁCE A NÁTERY																																																				
83	Reprofilácia pohľadov, nátery betón. povrchov																																																				
SO 03	**Rekonštrukcia priepustov**																																																				
SO 03.1	**Priepust č.1 v km 0,052**	**1 989,96**																																																			
SO 03.2	**Priepust č.2 v km 0,438**	**2 062,55**																																																			
SO 03.3	**Priepust č.3 v km 0,585**	**7 174,78**																																																			
SO 03.4	**Priepust č.4 v km 1,710**	**12 812,24**																																																			
SO 03.5	**Priepust č.5 v km 2,172**	**14 725,41**																																																			
SO 03.6	**Priepust č.6 v km 2,458**	**2 031,19**																																																			
SO 03.7	**Priepust č.7 v km 2,527**	**1 727,39**																																																			
SO 03.8	**Priepust č.8 v km 2,950**	**702,17**																																																			
SO 03.9	**Priepust č.9 v km 3,000**	**1 007,76**																																																			
SO 03.10	**Priepust č.10 v km 3,147**	**1 173,80**																																																			
SO 03.11	**Priepust č.11 v km 5,257**	**12 978,38**																																																			
SO 03.12	**Priepust č.12 v km 6,327**	**35 448,63**																																																			
SO 03.13	**Priepust č.13 v km 2,503**	**19 372,94**																																																			
SO 03.14	**Priepust č.14 v km 2,839**	**20 162,07**																																																			
	Spolu bez DPH :	***2 505 337,74***														**509 955,57**				**502 695,59**																					**505 000,00**				**505 000,00**						**482 686,58**			
